ДОКЛАД ОТ ТЕКУЩА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „АЙТОС“

за целите на мониторинга на изпълнението на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Съдържание:

1. Списък на използваните съкращения 3
2. Въведение 4
3. Методология 5
4. Обща информация за МИГ „Айтос“ 7
5. Цели, приоритети и съдържание на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Айтос“ 9
6. Изпълнение на СВОМР 11
Добри практики 24
Изводи и препоръки 34
7. Заключение 40

1. Списък на използваните съкращения

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие”
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
КППП	Комисия за подбор на проектни предложения
МИГ	Местна инициативна група
МЗм	Министерство на земеделието
МФ	Министерство на финансите
НЧ	Народно читалище
НПО	Неправителствена организация
ОСП	Обща селскостопанска политика
ПП	Проектно предложение
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
РА	Разплащателна агенция
СВОМР	Стратегия за Водено от общностите местно развитие
СНЦ	Сдружение с нестопанска цел
СМР	Строително-монтажни работи
УО	Управляващ орган

2. Въведение

Докладът от извършените мониторинг и оценка на прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за 2021 г. и 2022 г. е изготвен за сдружение „Местна инициативна група "Айтос" (МИГ „Айтос") като част от дейностите за мониторинг на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие. Дейността е финансирана в изпълнение на споразумение № РД 50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на този доклад за мониторинг и оценка е да проследи и оцени изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение МИГ "Айтос" за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. Дейността се извършва в изпълнение на една от задачите на МИГ, свързана с мониторинг на прилагането на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.

За изготвянето на оценката е използвана информация от източниците, изброени по долу:

- Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
- Стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос";
- Годишни доклади по подмярка 19.2 и 19.4 за 2021 г. и 2022 г. на МИГ "Айтос";
- Протоколи от проведени заседания на УС на МИГ „Айтос" през 2021 г. и 2022 г.;
- Протоколи от проведени Общи събрания на МИГ „Айтос" през 2021 г. и 2022 г.;
- Оценителни доклади от проведени КППП през 2021 г. и 2022 г.;
- Регистър на входираните проектни предложения;
- Проведени разговори с персонала на МИГ – изпълнителен директор, експерт прилагане на СВОМР и счетоводител на МИГ;
- Проучване на мнението на представители на местната общност относно прилагането на стратегията за ВОМР;
- Проучвания и анализи, извършени в изпълнение на подмярка 19.4.

Оценката има за цел да:

- Да представи независим преглед на изпълнението на СВОМР на МИГ „Айтос" като се проследи напредъка в този процес.
- Да предостави информация за взимане на управленски решения от страна на МИГ „Айтос" при прилагането на стратегията за ВОМР.

Докладът за мониторинг и оценка представя резултатите и степента на напредък в изпълнението на СВОМР и постигането на заложени индикатори. Тази оценка предлага информация относно нагласите на местната общност на МИГ „Айтос" от прилагането на стратегията за ВОМР.

С цел последователност и логичност в текста на всяка от частите на проучването има направени изводи и препоръки за разглеждания период 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г.

Документът представя заключения, анализи, изводи и препоръки на базата на използваните данни. При необходимост те биха послужили за подобряване на изпълнение на СВОМР на МИГ „Айтос“.

3. Методология

Основните методи за оценка на СВОМР са:

- преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР – протоколи за взети решения от Управителния съвет и Общо събрание на МИГ, оценителни доклади от проведени КППП, регистър на входираните проектни предложения, текущи годишни доклади по изпълнение на СВОМР и други;
- сравнителен анализ на планираното и постигнатото до 31.12.2022 г., както и на степента на постигане на заложените индикатори. При оценката на СВОМР се взимат предвид следните видове индикатори (показатели):
- индикатори за вложените ресурси (изходни), например: разходи по мерки, разходи за управление на СВОМР);
- индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко реализираните дейности по мерките, като например: брой бенефициенти, получаващи инвестиционна подкрепа, общ обем на инвестициите и др.;
- индикатори за резултат: измерват преките последствия (ползи) след изпълнението на проектите и така се оценяват и самите мерки. Те осигуряват информация за промените в поведението, капацитета или резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици (например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители);
- индикатори за въздействие: изразяват ползите от намесите (проектите и мерките) не само на равнище подпомагане на бенефициенти, но и по-високо, на ниво „общност“, „територия“ и т.н. Тези индикатори са свързани с по-широките (общите) цели на програмата (например: увеличаване на заетостта в територията, увеличена производителност на селскостопанския сектор и др.). От особена важност е в процеса на оценка да се анализира приложимостта и полезността на всеки индикатор с оглед целите на оценката - анализ на напредъка спрямо заложените цели; както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста на актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване на стратегията или дадени предпоставки да не са се осъществили.
- проучване на мнението на персонала на МИГ – изпълнителен директор, експерт СВОМР и счетоводител на МИГ, относно прилагането на стратегията за ВОМР;
- проучване на мнението на представители на местната общност относно прилагането на стратегията за ВОМР.

Оценката приключва със заключение за изпълнението на СВОМР на МИГ за периода 01.01.2021 – 31.12.2022 г.

При изготвянето на настоящия доклад за мониторинг и оценка на прилагането на СВОМР на МИГ „Айтос“ е взета предвид и системата за мониторинг, описана в т. 8.4. от Стратегията. В т.8.4. от Стратегията за ВОМР е дефинирана рамката на системата за мониторинг и оценка, която се прилага от МИГ „Айтос“. В нея мониторингът се определя като системно и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за управленски контрол и вземане на решения, а

оценката се определя като преценка на публичните политики от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворяване се цели с тях. МИГ осъществява мониторинг на всички равнища на административна дейност. При него се използват както официални доклади, така и неофициални съобщения, като акцентът може да се постави върху:

- използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите ресурси);
- планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на изпълнението);
- получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите).

Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на инициативата и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните органи (УО на ПРСР, Общото събрание и Управителния съвет на МИГ), както и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка, или за липсата на напредък по постигането на целите и резултатите, залегнали в СВОМР. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на СВОМР, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните необходими корективни действия. МИГ предвижда да разработи план за осъществяване на мониторинг за реализацията на стратегията, включващ: показатели за крайния резултат, източници на данните, методите за събиране на данните, кой ще събира данните и с каква честота и кой ще използва информацията. МИГ ще извършва редовни мониторингови посещения, според предварително разработен план-график. Те ще бъдат насочени към проследяване изпълнението на проектните дейности и качеството на услугите, потвърждаване, че услугата реално е била предоставена, инвестициите са били извършени, а правилата - спазени. Освен това мониторинговото посещение ще включва физическа проверка дали обектът на договора е наистина наличен, съгласно спецификациите на проекта, както и че е правилно отразен.


На този етап МИГ „Айтос“ е изградил и поддържа собствена база данни, чрез която е предвидена възможност за проследяването на определен набор от финансови индикатори, между които: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Тези базисни индикатори ще се допълват от поредица от индикатори за резултат и въздействие, които се осигуряват от информационната система. Екипът на МИГ поддържа актуална информация по отношение на напредъка по изпълнението на стратегията като редовно проследява заложените индикатори.

Въпроси за оценка

При изготвяне на настоящата оценка са използвани и въпроси към представители на МИГ и местната общност, които установяват връзката между заложените цели и постигнатите резултати, между индикаторите и степента на постигане на целите.

4. Обща информация за МИГ „Айтос“

Територията на Местна инициативна група Айтос припокрива напълно територията на Община Айтос и е разположена в източната част на страната. Формира дял от централната част на северната периферия на област Бургас и включва части от източна Стара планина (Карнобатска и Айтоски планини), долината на Айтоска река и част от северната граница на Бургаската низина. От гледна точка на стратегическите предимства, с най-голямо значение за нейното развитие се явява географската близост и транспортно-комуникационната свързаност с икономическия и административен център на Югоизточния район – гр. Бургас, което открива добри възможности за подобряване на общественото обслужване и привличането на инвестиции.

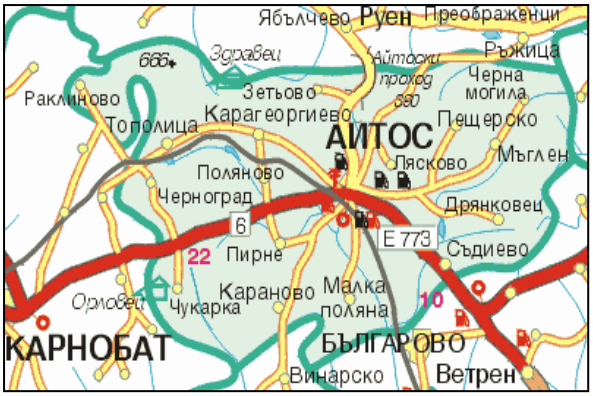

Съгласно данни от НСИ към 31.12.2020 г. населението на територията на МИГ е общо 27 610 жители. Разпределението на населението по населени места е представено в долната таблица.

Населено място	**Брой жители**
Община Айтос	**27610**
гр.Айтос	19142
с.Дрянковец	181
с.Зетьово	228
с.Карагеоргиево	1281
с.Караново	464
с.Лясково	139
с.Малка поляна	383
с.Мъглен	1259
с.Пещерско	646
с.Пирне	689
с.Поляново	343
с.Раклиново	132
с.Съдиево	406
с.Тополица	885
с.Черна могила	338
с.Черноград	487
с.Чукарка	607

Сдружение „Местна инициативна група „Айтос” е създадено през 2008 г. и регистрирано със съдебно решение № 39/2008 на Бургаски окръжен съд. Съгласно Устава на организацията, Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на Сдружението. То се състои от 35 членове на Сдружението и включва представители на над 70 % от населените места на територията на МИГ:

От Общото Събрание 1 член е представител на община Айтос (2,86 %), 17 са представителите на стопанския сектор (48,57 %) и 17 са представители на сектора на читалища, неправителствените организации и граждани самоопределили се като нестопански сектор (48,57 %). Нито един от представените сектори в Общото събрание не превишава 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Освен основните си правомощия по ЗЮЛНЦ, ОС избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС) и Контролния съвет /КС/, чрез явно гласуване, изключва членове и приема членове в случаи на отказ от страна на УС. По отношение на Стратегията за ВОМР, ОС я приема и одобрява както самата стратегия, така и нейния бюджет и годишните доклади за отчитането й.

Управителния съвет /УС/ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. УС се избира от ОС с мандат от 5 години. УС избира от състава си Председател и избира и освобождава Изпълнителния директор. По отношение на Стратегията за ВОМР, УС предлага на ОС бюджета и план за изпълнението; избира и освобождава Комисии за оценка и избор на проекти; взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР и др.

Контролния съвет на СНЦ “МИГ Айтос ” се състои от 3 – ма души, членове на Общото събрание. Избира се от Общото събрание за срок от 2 (две) години, без ограничение в броя на мандатите. Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас. Основните задължения и права на контролния съвет са да контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението; контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението; извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки и ревизии в системата на МИГ „Айтос”, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, търговски, договорни и други дейности.

Комисията за избор на проекти /КИП/ е временен орган на МИГ, чийто брой и състав се определя от Управителния съвет. Назначава се със заповед на Председателя на УС, във връзка с обявените покани за кандидатстване от МИГ и с цел подбор и одобрение на подадените заявления за подпомагане. В състава на Комисията за избор на проекти могат да бъдат назначавани служители на МИГ, членове на колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители, като основно изискване е тези лица да са различни от лицата извършили проверката за административно съответствие и допустимост и от членовете на колективния управителен орган /УС/. Не по-малко от 1/3 от членовете на КИП са членове на колективния върховен орган /ОС/ на МИГ. Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. В състава на КИП могат да бъдат допускани и наблюдатели без право на глас, определени от Управляващият орган на програмата, от която се предоставя финансиране по съответната процедура за подбор на проекти. Когато участват в комисията за избор на проекти, членовете на КИП подписват декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на ал. 1 т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. В случаите когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от нов член.

Основно изискване за състава на всички органи /ОС, УС, КС и КИП/ на МИГ „Айтос“ е да имат дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

5. Цели, приоритети и съдържание на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Айтос“

Целите на стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос“ и приоритети за развитие на територията са както следва:

Стратегическа цел:

Стимулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ „Айтос” в динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21ви век условия, качество и стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси.

• Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението;

• Приоритет 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на територията на МИГ „Айтос”.

Специфични цели:

Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението:

• Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции;

• Специфична цел 1.2: Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси вериги на доставка;

• Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Приоритет 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на територията на МИГ „Айтос”:

• Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общности;

Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси.

Постигането на стратегическата цел е прогнозирано и планирано чрез използване на модели и подход на прилагане на два основни приоритета, с общо пет специфични цели. Специфичните цели ще бъдат постигнати чрез насърчаване прилагането на различни мерки:

Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението:

Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции:

• Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Специфична цел 1.2: Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси вериги на доставка:

• Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”;

Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес:

• Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Приоритет 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природните и културни ресурси на територията на МИГ „Айтос“:

Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общности:

• Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси;

• Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Поставените специфични цели и избраните приоритети за развитие са взаимно обвързани и постигането им ще има интегриран ефект върху развитието на територията и постигане на стратегическата цел. Приоритет на развитие на територията на МИГ „Айтос”, е добавяне на стойност към продукти от земеделски и неземеделски бизнес, чрез инвестиции за модернизиране на аграрния сектор и интензивно и устойчиво производство на плодове и зеленчуци, осигуряване на възможности за развитие на преработка и маркетинг на земеделски продукти. Една от основните цели както на СВОМР, така и на национално и европейско ниво, е създаването на нови работни места и намаляване на бедността, което е планирано за постигане както чрез подпомагане на инвестиции за развитие на неземеделски бизнес, така и чрез всички останали специфични цели. За осигуряване на „трайни спомени от преживявания” за посетителите на територията са необходими инвестиции в съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура и тяхното пребиваване да е бъде осъществено в естетична среда, която да даде възможност за интересно и динамично прекарване и по-дълъг престой. От друга страна, произвежданите на територията специфични местни продукти и изделия могат успешно да бъдат интегрирани в специфичен туристически продукт, по този начин да осигури добавена стойност за туристическия продукт и в същото време – пазар за местните производители. Важно както за развитието на агросектора, така и на туризма, е утвърждаването и интегрирането на местни продукти като елемент от уникална за територията отличителна местна запазена марка или специфични, единствено познати от тази територия продукти, дейности и услуги.

6. Изпълнение на СВОМР

Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 за 2021 г.

На 27 .03.2021 г. е проведено заседание на Общото събрание на МИГ „Айтос“, на което са приети годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за дейността на МИГ „Айтос“ за 2020 г. и годишния финансов отчет за 2020 г. С решение на ОС е преизбран Управителният съвет на МИГ „Айтос“.

На 09.03.2021 г. е проведено заседание за УС за свикване на редовно заседание на Общо събрание на МИГ „Айтос“.

На 12.03.2021 г. е проведено заседание на УС, на което с решение на УС по протокол от 12.03.2021 г. са утвърдени коригираните документи на Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.226 на МИГ „Айтос“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с трети краен срок от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Айтос“ с трети краен срок за прием.

На 27.003.2021 г. е проведено заседание на УС за избор на председател и зам. председател на МИГ. За председател на МИГ „Айтос“ е преизбран Стоян Иванов Стоянов, представител на Община Айтос, а за зам. председател е преизбран Милен Георгиев Лазаров.

Изготвен е Годишен доклад за 2020 година за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Айтос“. Докладът е одобрен от УО с писмо и изх. N19-19-2-01-45/31.03.2021 г.

Екипът на МИГ „Айтос“ е изготвил и внесъл в ДФ „Земеделие“ заявка за междинно плащане за периода от 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

С писмо с изх. № 288/07.04.03.2021 г. е изпратен Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки независимо от източника им на финансиране за текущата 2021 г. и предходната 2020 г.

Във връзка с реализация на дейностите по изпълнение на СВОМР на МИГ „Айтос“ са направени и следните разходи:

1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата па нормативен актразходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност и други, дължими от работодателя (чл. 9, ал. 2, пи 1 от Наредба Хе 1). Извършени са разходи за възнаграждения и осигуровки на екипа на МИГ „Айтос“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

2. Непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1/16 Разходи за услуги непряко свързани с прилагането на стратегията (правни, счетоводни, одиторски и други).

3. Разходи за наем на офис, съгласно договор от 30.06.2017 г. с „Крисми”ООД гр. Айтос.

4. Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги, електроенергия и др.).

5. Пощенски разходи, извършени от „Български пощи“ ЕАД.

6. Разходи за телефон, доставчик БТК ЕАД.

7. Разходи за електроенергия, „ДРИЙМ РЕЛАКС СЕНТ ДЖОРДЖ“ ООД.

8. Разходи за доставка на интернет, доставчик „КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ ООД.

9. Разходи за закупуване на офис консумативи и канцеларски материали,доставчик „БАРС 10“ ЕООД.

10. Разходи за почистване на офисите на МИГ „Айтос“, ГД 41/04.01.2021 г. с Ирина Пейчева Димитрова.

11. Други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането на офиса.

През отчетния период са извършени следните разходи за популяризиране на СВОМР на МИГ „Айтос“:

1. Разходи за поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос по чл.9 ал.3, т.2 а). Важен инструмент за информиране на местните общности и заинтересованите страни (публичен сектор. НПО и бизнеса) на територията на МИГ „Айтос“ е разработеният и действащ информационен портал с адрес www.mig-aytos.com. От него може да бъде получена актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ „Айтос“ и процеса на прилагане на стратегията ВОМР. Публикувана е необходимата информация съгласно изискванията за публичност на чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015. Интернет страницата на МИГ „Айтос“ отговаря на изискванията за визуализация от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Дейността за домейн и хостинг е изпълнена от „Супер хостинг.БГ“ ООД, гр. София.

За отчетния период МИГ „Айтос“ е провела 1 оценителна сесия по процедура за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.226 МИГ „Айтос“ по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - (трети прием). Процедура с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.226 е обявена с три крайни срока за подаване на проектни предложения. В рамките на трети краен срок за подаване на проектните предложения 30.06.2021г.са постъпили три проектни предложения. Със Заповед № 3-7.2./01.07.2021 г. на Заместник - председателя на СНЦ МИГ „Айтос“ е назначена Комисия за подбор на проектни предложения (КППП). Сключени са четири граждански договора. КППП е приключила оценката с Оценителен доклад от 11.08.2021г., който е одобрен от УС на 16.08.2021г.

МИГ „Айтос“ използва програмен счетоводен продукт „ПП Джейс". Извършени са разходи за годишна актуализация за 2021 год. на модули "Счетоводна отчетност" и "Дълготрайни активи" за едно работно място". Дейността е осъществена въз основа на Абонаментен договор за нормативна поддръжка NA 1-1025/2021г.

МИГ използва в отчетната си дейност счетоводен софтуер "Микроинвест“, включващ два модула „Труд и работна заплата“ (ТРЗ) и „Личен състав“ (ЛС). През 2021 година има извършена една актуализация (1 бр. актуализационен код) за едно работно място. Дейността е осъществена, съгласно договор от 16.07.2019г. с „БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и анекс от 25.06.2021г.

Извършено е едно проучване, съгласно Договор от 08.07.2021г. с изпълнител ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ МИТЕВ“. В обхвата на реализираната дейност са включени два анализа на следните теми:

I.Проучване капацитета на Местна инициативна група Айтос, основаващо се на елементи на функционален анализ с фокус възможностите за диферсификация на дейността в съответствие с прилаганите разнообразни форми на подхода ВОМР за подобряване на потенциала за развитие на местната общност.

II.Проучване и анализ на добавената стойност, получена от прилагането на СВОМР на територията на МИГ „Айтос“ в контекста на подхода ВОМР.

Реализирани са 7 броя цветни публикации във вестник „Народен приятел“- приложение на регионален вестник „Черноморски фар“ както следва:

1 Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 65/8282/ 21-23., септември 2021г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 4973/21-23 септември 2021г., страница 4 на теми „МИГ-Айтос подписа осми договор по Стратегията за ВОМР“ и „Покана“ - за участие в еднодневни обучения;

2. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 69/8286/ 5-7 октомври 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 501/5-7 октомври 2021 г., страница 4 на тема „Община Айтос кандидатства с три нови проекта за финансиране от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Айтос“.

3. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 71/8288/ октомври 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 503/12-14 октомври 2021 г., страница 1 на тема „С нов увеличен финансов ресурс е стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос“.

4. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 74/8291/22-25 октомври 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 506/22-25 октомври 2021 г., страница 1 на тема „Чрез поредица от обучения, МИГ „Айтос“ продължава да популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие“;

5. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 81/8298/16-18 ноември 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 513/16-18ноември 2021 г., страница 4 на тема“ Инвестиции в здравни услуги по проекти от стратегията на Местна
инициативна група Айтос“;

6. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 86/ 8303/ 3-6 декември 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 515/3-6 декември 2021 г., страница 4 на тема“ „Стартират още два проекта финансирани от стратегията на „Местна инициативна група Айтос“;
7. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 88/8305/ 10-13 декември 2021г., приложение вестник „Народен приятел“, брой 517/10-12декември 2021 г., страница 4 на тема „30 години ЛИДЕР/ВОМР“.

Реализирани са 7 броя излъчвания в регионални електронни медии (радио и телевизионни медии), включващи общо 30 минути, от които 10 минути в регионална телевизия и 20 минути в две регионални радиа.

Излъчвания в Телевизия „Канал 0 Бургас“:

- 1 (едно) излъчване заснето с камера на 20.12.2021 г. в 14:10 часа с продължителност 10 минути, свързано с популяризиране на дейността на МИГ на тема „Напредък в изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Айтос“ към 13.12.2021година;

Излъчвания в Радио – 20 мин:

- Радио MIXX 92.9 FM

Общ брой излъчвания:- 3 с обща продължителност 9 мин.

- 26.10.2021 г. в 16:20 часа с продължителност 3.33 мин. на тема „Местна инициативна група Айтос проведи поредица от обучения за развитие на местните общности“;

- 22.11.2021 г. в 18:10 часа с продължителност 3.59 мин. на тема „Местна инициативна група Айтос“ е подписала два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за здравни услуги“;

- 07.12.2021г. в 18:15 часа с продължителност 3.56 мин. на тема „Стартират още два проекта, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Айтос“;

Радио „Дарик – Бургас“

Общ брой излъчвания:- 3 с обща продължителност 11 мин.

- 28.10. 2021г. в 11:05 с продължителност 3:47 мин. на тема „Местна инициативна група Айтос“ проведе поредица от обучения за развитие на местните общности“;

- 23.11.2021г. в 11:10 с продължителност 3:13 мин. на тема „Местна инициативна група Айтос“ подписа два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за здравни услуги“;

- 06.12.2021г. в 11:15 с продължителност 5:07 мин. на тема „Стартират още два проекта, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Айтос“;

Извършени са разходи за издаване на информационен бюлетин на МИГ „Айтос“ - 4 издания, всяко в тираж 1000 броя.

Изработени са и са доставени различни рекламни материали, както следва: 200 броя външни преносими батерии за мобилен телефон, многофункционална чанта за документи от полиестер (размери 380 х 290 х 80 мм) - 200 бр., комплект тефтер с химикал, брандиран съгласно изискванията за визуализация – 200 броя комплекти, 200 бр. USB памет - 32 GB, брандирана съгласно изискванията за визуализация, 200 бр. стенен календар с три тела, брандиран съгласно изискванията за визуализация, 200 бр. визитник (метал и кожа), брандиран съгласно изискванията за визуализация.

През 2021 г. са проведени три еднодневни обучения за бенефициенти, местни лидери и други заинтересовани страни на тема „Най - често допускани грешки в процеса на изпълнение на проекти. Финансови корекции" за най-малко 10 участници. Обученията са проведени в гр. Айтос на 24 август, 24 и 28 септември 2021 год.

Предмет на разглеждане са били:

- Ръководство за изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020;

- Грешки, които водят до намаляване на финансовата помощ или частичното й или пълно възстановяване;

- Грешки при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от Стратегията за ВОМР по реда на Закона за обществените поръчки и по ПМС 160;

- Финансови корекции. Видове нередности. Определяне на финансовата корекция. Проведени бяха четири еднодневни обучения с практическа насоченост на тема:

„Иновативни модели за активиране на участието на социално- уязвимите групи в процеса на прилагане на СВОМ". Обученията се проведоха при следния график:

- 17.08.2021 год. от 10:15 часа в залата на НЧ „Пробуда”, с. Мъглен;

- 18.08.2021 год. от 10:15 часа в залата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Пещерско;

- 26.08.2021 год. от 10:30 часа в залата на НЧ „Петър Житаров”, с. Карановo;

- 17.09.2021 год. от 10:30 часа в залата на НЧ „Пробуда-1925г“, с. Пирне.

По време на обученията присъстващите са се запознали с иновативни модели и интерактивни техники за работа със социално-уязвими групи, с акцент иновативните начини, по които ВОМР насърчава социалното приобщаване, и как може да бъде направено това на практика, като се отбелязват разнообразните социални предизвикателства - маргинализираните групи (роми и др. етнически малцинства), застаряващото население и хората с увреждания.

Обучението включва:

- Напредък в изпълнението на СВОМР на МИГ „Айтос“;
- Подходът ЛИДЕР/ВОМР - инструмент за развитие на селските райони;
- Иновативни модели и практики - Центрове за комплексни услуги;
- Европейски подходи за директна подкрепа на социално уязвими групи;
- Добри практики от България за насърчаване на активния живот на възрастните хора;
- Стратегията за ВОМР - възможности за финансиране на местни проекти за развитие на територията.

В периода от 27 до 29 юни 2021г. МИГ „Айтос“ е бил домакин на тридневно работно посещение на представители от МИГ „Завет-Кубрат“. Участниците от двете МИГ са обменили информация, добри практики и научени уроци в процеса на прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Двете МИГ изпълняват еднофондови стратегии в настоящия програмен период. Опитът на МИГ „Завет-Кубрат“ е важен, тъй като МИГ „Айтос“ прилага

местната стратегия само на територията на едноименната община Айтос, докато МИГ „Завет-Кубрат“ подкрепя местното развитието на две общини Завет и Кубрат. Представени са били и добри практики, свързани с изпълнението на проекти по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

През 2021 г. са извършени и редица дейности, свързани с консултиране и обучение на местната общност. Данните за тези дейности са представени в следващата таблица.

Индикатор	***Мъже***		***Жени***		***Общо***
	< 25	***>25***	***< 25***	***>25***	
Брой консултирани потенциални бенефициенти	0	9	0	10	19
Брой на участниците в обучения	4	14	10	49	***77***

Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 за 2021 г.

Подготвена е за откриване Процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ „Айтос“ по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – трети прием.

С решение на УС от 12.03.2021 г. са утвърдени коригираните документи на Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.226 на МИГ „Айтос“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура с трети краен срок от СВОМР на МИГ „Айтос“ с трети краен срок за прием.

В периода 12.05.2021г. - 30.106.2021г. СНЦ МИГ „Айтос" е реализирала трети прием по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 МИГ „Айтос“ - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". По процедурата имат възможност да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна помощ община Айтос, читалища, неправителствени организации. По приема са постъпили три проектни предложения от Община Айтос с общ размер на БФП 461 012 лева:

- BG06RDNP001-19.226-0004, „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“. Планираните инвестици са насочени към всички 10 (десет) читалища на територията на МИГ;

- BG06RDNP001-19.226-0005, проект „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“

- BG06RDNP001-19.226-0006, Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“.

МИГ „Айтос“ е сключила десет административни договори за изпълнение на проекти по процедури, приключили през 2019 и 2020 година:

- един по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, процедура №BG06RDNP001-19.333;

- шест по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, процедура №BG06RDNP001-19.270;

- два по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", процедура №BG06RDNP001-19.226;

- един по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, процедура №BG06RDNP001-19.334.

През 2021 г. са сключени 3 (три) административни договори за изпълнение на проекти към СВОМР в обществена полза:

1. BGO6RDNP001-19.226-0003-C01/2021 от 26.01.2021 г. „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”, с бенефициент Община Айтос, стойност на проект и на БФП 390 517,84 лева, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226-0003-S2;

2. BG06RDNP001-19.226-0001-C02/2021 от 19.03.2021 г. „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос", стойност на проекта 389 982,66 лева, размер на БФП 268 416,00 лева., процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226-0002-S1;

3. BG06RDNP001-19.334-0001-C01/2021 г. от 04.03.2021 г. „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”, процедура с код в ИСУН 3 BG06RDNP001-19.334-0001-S1.

През отчетния период, за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и популяризиране на дейностите си, МИГ „Айтос“е провела:

- деветнадесет индивидуални консултации на заинтересовани лица, свързани с ИГРП във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения, възможностите за кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и др.;

- три едноеднодневния обучения за бенефициенти, кандидати с проектни предложения, местни лидери на тема „ Най - често допускани грешки в процеса на изпълнение на проекти.Финансови корекции“;

- поддържа актуална информация за приемите и възможностите за кандидатстване на електронната си страница www.mig-aytos.com и чрез публикации в местната преса.

С изпълнението на дейностите през 2021г. МИГ „Айтос“ е обхванала по-голямата част от зантересованите страни на територията си. В процес на изпълнение са общо 13 (тринадест) проекта.

В СВОМР на МИГ „Айтос“ са идентифицирани три основни уязвими групи: самотни възрастни хора в пенсионна възраст, хора с увреждания и етнически малцинства. През 2021 г. постигнатото въздействие върху уязвимите и малцинствени групи се изразява в проведените четири еднодневни обучения на тема: „Иновативни модели за активиране на участието на социално- уязвимите групи в процеса на прилагане на СВОМР", проведени както следва:

- 17.08.2021 год., НЧ „Пробуда”, с. Мъглен;
- 18.08.2021 год., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Пещерско;
- 26.08.2021 год., НЧ „Петър Житаров”, с. Караново;
- 17.09.2021 год., НЧ „Пробуда-1925г“, с. Пирне.

Участниците са запознати с напредъка в изпълнението на СВОМР, възможностите за кандидатстване с проекти, както и с иновативни модели, чрез които подхода ВОМР насърчава социалното приобщаване, и как може да бъде направено това на практика. Обученията допринасят за активизиране на местните общности за участие в процеса на прилагане на СВОМР и развитие на местен капацитет.

МИГ „Айтос“ е сключила два договора за изпълнение на проекти, отговарящи на изискванията за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0003-C01/26.01.2021, проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“;

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0002-C03/19.03.2021, проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”.

Постигането на стратегическата цел е прогнозирано и планирано да се извърши, чрез използване на модели и подходи за прилагане на двата основни приоритета, с общо пет разпределени по между им специфични цели. Специфичните цели от своя страна, е заложено да се постигнат от страна на МИГ „Айтос“ посредством насърчаване в участието и прилагането на съответните мерки за финансово подпомагане.

През 2021 г. с приетите и одобрени проектни предложения, МИГ „Айтос“ работи по изпълнението на стратегическата цел, двата приоритета и петте специфични цели, заложени в СВОМР както следва:

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението.

Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.

- Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Сключване на Административни договори за изпълнение на проекти

МИГ „Айтос“ е сключила един административен договор с регистрационен номер BG06RDNP001-19.333-0002-C01/31.08.2021г. за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни с бенефициент ЗП Шефика Мехмед Шаиб по процедура с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.-S1 МИГ Айтос Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – първи прием (приключена през 2020 г.).

МИГ е изготвила становище относно искане за промени в административния договор и е сключила анекс BG06RDNP001-19.333-0002-C2 от 18.11.2021г.

Изпълнението на проекта ще има пряк принос за постигане на СЦ1.1, П1, СЦ.

Специфична цел 1.2: Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси вериги на доставка.

- Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

През 2021 г. МИГ е извършила:

- Рестартиране на процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.331 S1. Въз основа на Уведомително писмо с изх.. № 01-6300/351 от 23.03.2021 г. от ДФ „Земеделие“ със Заповед №4 от 31.03.2021г. на Председателя на УС на МИГ „Айтос“ е възстановена работата на КППП на етап ОАСД. В съответствие с указанията на ДФЗ, КППП е отхвърлила проектно предложение с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.331-0001 на „Бенони“ ЕООД. Новият Оценителен доклад е одобрен с решение на УС от 29.04.2021 г. С писмо с изх. № 291/05.05.2021 г. МИГ е информирала УО на ПРСР 2014-2020 и ДФ „Земеделие“ за приключената процедура.

С писмо с изх. № 01-6300/960 от 05.08.2021г. ДФЗ е информирал МИГ за одобрение на процедурата (Заповед 03-РД/2261 от 21.06.2021г.).

По Заявление на бенефициента „Хелиос милк“ ЕООД, МИГ е изготвила и изпратила становище за сключване на анекс към Административен договор №BG06RDNP001-19.331-0002-C01/19.11.2020г., по проект „Модернизация на млекопреработвателно предприятие“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на СЦ1.2, П1 и СЦ.

Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

През 2021 г. МИГ “Айтос” е сключила шест административни договори за изпълнение на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.270 – (първи и втори прием - приключени през 2020 год.):

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0012-C01/12.04.2021г., проект „Закупуване на машини за производство на бисквити“, бенефициент "КОСТОВИ ГРУП" ООД;

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0002-C01/25.10.2021г., проект „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“, бенефициент ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВАСИЛЕНА ЧАУШЕВА ЕООД;

- Регистрационен номер BG06RDNP001- 19.270-0009-C01/29.10.2021г., проект "Закупуване на специализирана медицинска техника за кабинет на доктор-гинеколог", бенефициент СЕ БЕ ГИН - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА (АСИМПАГИП) ЕООД;

- Регистрационен номер G06RDNP001-19.270-0010-C01/03.11.2021г, проект „Изграждане на производствена сграда и закупуване на машини за производство на PVC и алуминиева дограма”, бенефициент АНГЕЛИКА - 81 ООД;

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0003-C01/16.11.2021г., проект „Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“, бенефициент ДЖИ ЕС КАР ООД;

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0006-C01/17.11.2021г., проект „Оптимизиране на производствения процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНА“, бенефициент "ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД.

Изпълнението на одобрените за финансиране проекти по мярка 6.4.1 допринася за насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес на територията на МИГ “Айтос”, както и за постигане на П1 и СЦ на СВОМР.

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на територията на МИГ „Айтос“.

Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общности;

- Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

През 2021 г. МИГ “Айтос” е сключила два адмистративни договора за изпълнение на проекти по процеура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура –(първи и втори прием - приключени през 2019г и 2020г.):

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0003-C01/26.01.2021, проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”, бенефициент Община Айтос;

- Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0002-C03/19.03.2021, проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“, бенефициент Община Айтос.

МИГ “Айтос” е изготвила и становища за сключване на анекси към цитираните административни договори. Сключени са два анекса към договор с регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0003-C01/19.03.2021 и един анекс към договор с регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0002-C03/26.01.2021.

В периода 12.05.2021г. - 30.06.2021г. СНЦ „МИГ “Айтос” е осъществила трети прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". Подадени са три проектни предложения от Община Айтос с общ размер на БФП: 461 012,01лв.

Специфична цел 2.1, Приоритет 2 ще се реализират с изпълнението на одобрените от МИГ проектни предложения 3 броя и сключените административни договори.

Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси.

- Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

МИГ „Айтос“ е сключила един административен договор за изпълнение на проект с регистрационен номер BG06RDNP001-19.334-0001-C0204.03.2021, с наименование „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”.

Проектът е в унисон и пряко ще допринесе за изпълнение на СЦ2.2, П2 и СЦ.

Изпълнение на индикаторите от СВОМР.

Индикатори по мярка 4.1.1

Вид	**Индикатор**	**Мерна единица**	**Цел 2025**	**Постигнато в периода на докалада**	**От началото на Споразум**	**Източник на данни**
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	1	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	1	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ обем на инвестициите	Лева	400 000	198 956.81	198 956.81	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	Брой	1	1	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Резултат	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	3	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ

	Брой стопанства, въвели нов продукт или технология	Брой	1	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Създадени нови насаждения	Дка	10	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой проекти с добавена стойност към земеделски продукти	Брой	1	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Създадени работни места	Брой	4	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Индикатори по мярка 7.2

Вид	**Индикатор**	**Мерна единица**	**Цел 2025**	**Постигнато в периода на доклада**	**От началото на СВОМР**	**Източник на данни**
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	9	6	7	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	9	6	7	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/	Лева	1418 538,44	693729.47	874229.47	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой подпомогнати нови туристически дейности	Брой	4	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Обем на инвестициите в туризъм	Лева	400 000	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	Брой	2	2	2	База данни и отчети МИГ и бенефициенти

	Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги	Лева	100 000	82099.10	82099.10	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Резултат	Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата	Брой	4	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой реализирани иновации - нова услуга за територията	Брой	2	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Подпомогнати микропредприятия в сферата на техническите услуги	Брой	6	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Общ брой създадени работни места	Брой	17	0	0	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Индикатори по мярка 6.4.1.

Вид	**Индикатор**	**Мерна единица**	**Цел 2025**	**Постигнато в периода на доклада**	**От началото на СВОМР**	**Източник на данни**
	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	7	2	3	*Мониторинг* *База данни и отчети МИГ*
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	1	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Изходен	Общ размер на инвестициите	Лева	2060164,45	461 012,00	938469,70	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой проекти за изграждане/подобр яване на сгради, свързани с предоставяне на услуги	Брой	2	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Изградени или ремонтирани детски площадки	Брой	2	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат	Заведения за социални услуги с подобрена база	Брой	1	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Подобрени младежки и спортни центрове	Брой	2	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Подобрени културни центрове	Брой	3	0	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Индикатори по мярка 7.5

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2025	Постигнато в периода на доклада	Постигнато от скл. на Спорзумението	Източник на данни
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	1	1	Мониторинг,База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1	1	Мониторинг, База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите	Лева	200 000,00	194 250.00	194 250.00	Мониторинг,База данни и отчети МИГ
Резултат	Брой посетители на подкрепените атракции	Брой	6 000	0	0	Проучване, Отчети бенефициенти
	Брой развити туристически атракции/обекти	Брой	2	0	0	Мониторинг,База данни, отчети МИГ и бенефициенти
	Брой туристически, посетителски или занаятчийски центрове, подпомогнати по мярката	Брой	0	1	1	Мониторинг,База данни, отчети МИГ и бенефициенти
	Подкрепени програми за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите	Брой	0	0	0	Мониторинг,База данни, отчети МИГ и бенефициенти

Въздействие	Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	%	0	70	0	Проучване Отчети бенефициенти
	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	Брой	0	8 000	0	База данни и отчети МИГ и бенефициенти НСИ

Добри практики

Добра практика при изпълнение на дейностите по подмярка 19.2 е установената ефективна комуникация с УО и в частност с отдел ВОМР към дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм.

Като добра практика могат да бъдат определени и работните срещи между МИГ в страната. В периода от 27до 29 юни 2021г. МИГ „Айтос“ е домакин на тридневно работно посещение на представители от МИГ „Завет-Кубрат“. Участниците от двете МИГ са обменили информация, добри практики и научени уроци в процеса на прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Двете МИГ изпълняват еднофондови стратегии в настоящия програмен период. Опитът на МИГ „Завет-Кубрат“ е важен, тъй като МИГ „Айтос“ прилага местната стратегия само на територията на едноименната община Айтос, докато МИГ „Завет-Кубрат“ подкрепя местното развитие на две общини – Завет и Кубрат.

Таблица с кореспонденцията на МИГ „Айтос“

Изх. номер и дата	Адресат	Вид на документа	Относно
272/26.01.2021г.	МЗХГ	Писмо	Годишен доклад по подмярка 19.4. за 2020год
273/26.01.2021г.	ДФЗ - София	Писмо.	Списък ОП, съгласно образец, за 4-то тримесечие на 2020г
274 /27.01.2021г.	ДФЗ ОД - Пазарджик	Писмо	Подписан Администратривен договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 26.01.2021
278/10.02.2021г.	ДФЗ ОД -Бургас	Писмо.	Доп. документи и разяснения към отговор от 13.10.2020 г. по процедура по мярка 19.331, първи прием
279/11.02. 2021 г.	МЗХГ	Писмо	Годишен доклад по подмярка 19.2 на хартиен и ел. носител
280/17.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	Молба за анекс към Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004- C01/17.12.2020 г. от „Дюлгер
282/26.02 2021 г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на допълнителни документи във връзка със Заявка за плащане №16
283 /26.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище по заявление за променя на банкова сметка на по Административен договор № BG06RDNP001-19.270-
284/26.02.2021г.	МЗХГ	Писмо	Представяне на пояснения и документи по проекто бюджет на МИГ-Айтос за 2021 г. в частта счетоводен

285/04.03.2021г.	ДФЗ	Договор	Административен договор №В G06RDNP001 -19.334-0001-С01/2021г., подписан от всички страни/екземпляр за
286/15.03.2021г.	МЗХГ	Писмо	Допълнителна информация във връзка с Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2020г.
288 /07.04.2021г.	ДФЗ	Писмо	Списък ОП съгласно бюджет за 2021 г. за предварителен контрол/на хартиен и ел. носител/
289/13.04.2021г.	ДФЗ ОД -Русе	Договор	Екземпляр от адм. договор В G06RDNP001-19.270-0012-С01/12.04.2021 г.
290/20.04.2021г.	ДФЗ	Писмо	Списък ОП за първо трим. на 2021г. на хартиен и ел носител
291/05.05.2021г.	ДФЗ, МЗХГ	Писмо	Приключила процедура по Мярка 4.2.1 - първи прием.
293/17.05.2021г	ДФЗ	Писмо	Становище относно искане за анекс към Адм.договор № BG06RDNP001-19.270- 0004-С01/ 17.12.2020 г.
294/27.05.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище за сключване на анекс към Адм.договр № BG06RDNP001-19.331- 0002-С01 19.11.2020 г., по
295 /28.05.2021г.	МЗХГ	Писмо	Заявление за промяна на Споразумение за финансиране на изпълнение на СВОМР на МИГ-Айтос
296 /07.06.2021г.	МЗХГ	Писмо	Покана за наблюдатели по процедура по мярка 7.2. от СВОМР - трети прием
297/11.06.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище относно искане за анекс Адм. договор № В G06RDNP001-19.270-0004- С01 17.12.2020 г.
298/22.06.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище за анекс към Адм. договор BG06RDNP001 - 19.334-0001 от 04.03.202
300/28.06.2021г.	МЗХГ	Писмо	Прдставяне на доп. документи и информация/сгл. УП на МЗХГ/ по Заявление за промяна на Споразумение за
302/19.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Списък ОП и Декларации към него във връзка със Заявка за плащане за 2-ро трим. на 2021г.
303/29.07.2021г.	МЗХГ, ДФЗ	Писмо	Уведомяване за провеждане на обучения на 17, 18, 24 и 26 август 2021г.
304 /30.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище за анекс към Адм. договор BG06RDNP001 - 19.334-0001 от 04.03.2021
306 /10.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Некоректно отразени договорирани средства по мярка 7.2. първи и втори прием
307/16.08.2021г.	ДФЗ,МЗХГ	Писмо	УП за приключила оценка на проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ-Айтос - трети прием
311/20.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Своевременно извършени корекции от страна на ДФЗ по процедура 7.2. трети прием
312 / 23.08 .2021 г.	ДФЗ	Писмо	Предоставяне на допълнителни документи по заявка за плащане УИН 02/19/4/0/00006/3/18
313/31.08.2021г.	ДФЗ -ОД ВИДИН	Писмо	Екземпляр от подписан Адм.договор BG06RDNP001-19.333-0002-С01 от 31.08.2021 г
314/31.08.2021г.	ДФЗ, МЗХГ	Писмо	Уведомяване на провеждане на обучения на 17, 24 и 28 септември 2021 г.
315/02.09.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище за анекс към Адм. договор № В G06RDNP001-19.226-0003-С01 от 26.01.2021 г

316/24.09.2021г.	МЗХГ	Писмо	Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г.
318/05.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище за сключване на анекс към Адм.годовор №B G06RDNP001-19.333- 0002-C01/21 31.08.2021 г.
319/05.10.2021г.	МЗХГ, ДФЗ	Писмо	Уведомяване за провеждане на информационни срещи през месец октомври 2021 г.
320/07.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Становище във връзка с искане за анекс към Адм.договор № BG06RDNP001- 19.226-0002-C01 19.03.2021
321/19.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Списък ОП за трето тримесечие на 2021 г.
322/21.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Уведомяване за отлагане на инф. срещи на основ. Заповед на здр. Министър РД- 01-856/19.10.2021 г.
323/22.10.2021г.	МЗХГ, ДФЗ	Писмо	Промяна в състава на КВО и УС на „МИГ-Айтос“ с приложения
324/25.10.2021г.	МЗХГ	Писмо	Допълнителни документи към заявление бюджет за 2022 г.
325/29.10.2021г.	МЗХГ, ДФЗ	Писмо	Молба за оказване на методическа помощ във връзка с Анекси към Административни договори
327/08.11.2021г.	МЗХГ	Писмо	Прдставяне на допълнителни . документи относно нов член на УС - Таня Колева - декларации и у-я липса задължения към Община Айтос
334/25.11.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на допълнителна информация в отговор на УП от ДФЗ по процедура BG06RDNP001-19.226-S3
336/21.12.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на документи съглано УП от ДФЗ по заявка №19
Вх. номер и дата	Адресат	Вид на документа	Относно
165/25.01.2021г.	Дфз	Писмо	Заповед за одобрение и АДМ ДОГОВОР по процедура BG06RDNP001-19.226-S2, ПП 0003
166/ 01.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изплащане на финансова помощ по заявка за плащане №14.
167/04.02.2021г.	Дфз	Писмо	Решение за изплащане финансова помощ по заявка за плащане №15
168/04.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	Отстраняване на нередовности по процедура BG06RDNP001-19.270 - S2
169/05.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	Доп. обяснения и док-ти по проект 19.226-0002
170 /08.02.2021г.	МЗХГ	Писмо	Одобряване на год. доклад по подмярка 19.4 за 2020 г
172/18.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	УП нередовности по заявка № 16
182/18.02.2021г.	ДФЗ	Писмо	УП за одобрен ПП 19.226-0002
183/22.02.2021г.	МЗХГ	Писмо	Искане за разяснения по заявление за бюджет за 2021 г. относно софтуеър Джей софт
186/01.03.2021г.	ДФЗ	Писмо	Заповед за одобрение процедура и адм. договор №B G06RDNP001-19.334-0001- C01/2021

187/02.03.2021г.	МЗХГ	Писмо	Искане за разяснение и допълнителна информация по Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2020 година
188/18.03.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на доп. документи от „Костови груп“ ООД
189/19.03.2021г.	ДФЗ	Писмо	Покана относно за подписване на адм. договор B G06RDNP001-19.226-0002-C01
190/26.03.2021г.	ДФЗ	Писмо	Преразглеждане от страна на МИГ на проведена процедура BG06RDNP0001- 19.331 S1
191/29.03.2021г.	МЗХГ	Писмо	Одобрение на Годишен доклад за 2020 г. по подмярка 19.2
192/05.04.2021г.	МЗХГ	Писмо	Заповед № РД 09-293/30.03.2021 г..на зам. м-ра на МЗХГ за утв. на Бюджета на МИГ за 2021 г.
193/09.04.2021г.	ДФЗ	Писмо	Заповед и адм. договор BG06RDNP001- 19.270-0012-C01
194/12.04.2021г.,	МЗХГ	Писмо	Възможност за допълнително финансиране по мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014-2020г.
196/19.04.2021г.	МЗХГ	Писмо	Поддържане персонала на МИГ за целия период на СВОМР
197/22.04.2021г.	ДФЗ	Писмо	Одобрение за изплащане на фин. помощ по д-р 19.226-001-C01/09.06.2020 г.
198/22.04.2021г.	ДФЗ	Писмо	Изплатен ДДС по д-р 19.226-001- C01/09.06.2020 г.
199/22.04.2021г.	МЗХГ	Писмо	Уведомление за осигуряване на онлайн излъчвания на дейности по чл. 23, ал.2 от Наредба № 1 /2016
204/07.06.2021г.	ДФЗ	Писмо	Анекс по д-р BG06RDNP001-19.226-002 C01/19.03.2021 г.
207/23.06.2021г.	МЗХГ	Писмо	Искане за доп. информация по заявление за промяна на споразумение за финансиране на изпълнение на СВОМР
208/02.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Екземпляр от сключен анекс към Адм. договор №B G06RDNP001-19.226-0002- C01 19.03.2021 г.
209/15.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изпл. на фин. помощ по заявка №02/19/4/0/00006/4/03/03/01
210/15.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изпл. на фин. помощ по заявка №02/19/4/0/00006/3/17/03/01
211/15.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изпл. на фин. помощ по заявка №02/19/4/0/00006/1/05/03/01
212/15.07.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изпл. на фин. помощ по заявка №02/19/4/0/00006/3/16/03/01
214/.04.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Изменение на договор BG06RDNP001- 19.334-0001/04.03.2021г.
215/11.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Заповед на зам. изп. директор 03- РД/2261 от 21.06.2021г. за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.331-S1 по мярка 4.2.1
217/13.08.2021г,	ДФЗ	Писмо	Неродовности по заявка № 18- наличие на задължения на членове на УС - Т.Минкова и ЧЕРИ 2001 ЕООД
218/20.08.2021г.	ДФЗ РРА-ЯМБОЛ	Писмо	Кконтролен лист от изършена проверка

219/24.08.2021 г	ДФЗ ОД-МОНТАНА	Писмо	Разяснения по ПП BG06RDNP001-19.333- 0001
220/24.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Предоставяне на разяснения по ПП В G06RDNP001-19.270-0002
221/25.08.2021г.	ДФЗ ОД-ПЛЕВЕН	Писмо	Предоставяне на разяснения по ПП В G06RDNP001-19.270-0007
222/25.08.2021г.	ДФЗ ОД-МОНТАНА	Писмо	Ппредоставяне на разяснения по ПП В G06RDNP001-19.270-0009
223/25.08.2021г.,	ДФЗ ОД-ВАРНА	Писмо	Предоставяне на разяснения по ПП В G06RDNP001-19.270-0003
224/26.08.2021г.	ДФЗ	Писмо	Заповед и адм. договор BG06RDNP001- 19.333-0003
225/27.08.2021г.	ДФЗ ОД-ЯМБОЛ	Писмо	Предоставяне на разяснения по ПП В G06RDNP001-19.270-0010
№231/16.09.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на декларации преди подписване на адм. договор със Севим Бекир - Боранова
232/17.09.2021г.	МЗХГ	Писмо	Заповед на зам.- министъра РД 09- 826/18.08.2021г. за утвърждаване на нов финансов план на СВОМР на сдружение МИГ „Айтос“
233/29.09.2021г.	ДФЗ	Ел. писмо чрез ИСУН	Одобрено ПП В G06RDNP001-19.270-0010 с корекции в бюджета
234/30.09.2021г.	ДФЗ	Ел. писмо чрез ИСУН	Одобрено ПП В G06RDNP001-19.270-0002 с корекции в бюджета
235/30.09.2021г.	ДФЗ	Ел. писмо чрез ИСУН	Одобрено ПП В G06RDNP001-19.270-0003
239/08.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Искане за предствяне на допълнителни документи и разяснения по ПП по мярка 4.1.1 , кандидат „Хелиос Милк“ ЕООД
240/11.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Решение за изплащане на фин. помощ по заявка за второ трим. на 2021 г./ без корекции
241/20.10.2021г.	МЗХГ	Писмо	Представяне на допълнителни документи по Бюджет 2022
242/20.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Уведомление по ПП 19.270-006, копие до МИГ
243/29.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Покана за сключване на адм. дгоговр с „Ангелика-81“ ООД, ПП 19.270-0010, мярка 6.4.1.
244/29.10.2021г.	ДФЗ	Писмо	Покана за скл. на адм.договр със Севим Бекир-Боранова , ПП 19.270-0009, мярка 6.4.1
245/01.11.2021г.	МЗХГ	Писмо	Искане за представяне доп. документи във връзка с промени в УС от 25.09.2021г.
246/03.11.2021 г.	ДФЗ	Ел. писмо чрез ИСУН	Искане на документи преди подписване на адм. договор с „Хелиос Милк“ ЕООД, по мярка 4.1.1
248/05.11.2021г.	ДФЗ	Писмо	Предствяне на документи преди скл. на адм. договор с „Юха -81“ ЕООД, ПП 19.270-0001
249/11.11.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на допълнителна информация по процедура В G06RDNP001-19.226-S
250/11.11.2021г.	ДФЗ	Писмо	Покана за подписване на адм. договор В G06RDNP001-19.270-0003-C01 с „Джи Ес Кар“ ООД

251/15.11.2021 г	ДФЗ	Писмо	Отговор на писмо за оказване на методическа помощ
253/18.11.2021г.	ДФЗ	Писмо	Покана за подписване на договор В G06RDNP001-19.270-0006-С01 с „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ЕООД
256/15.12.2021г.	ДФЗ	Писмо	Представяне на допълнителни документи по заявка за трето трим. на 2021г.
257/20.12.2021г.	ДФЗ	Ел. писмо по мейл	Електронно подписано копие на Заповед за одобрение на ПП №BG06RDNP001- 19.270-0001

Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 за 2022 г.

През 2022 г. са изготвени и представени в Министерство на земеделието: годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ - Айтос" за 2021 г. Същият е одобрен от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. с доклад № 93- 898/18.02.2022 г. (Писмо от МЗм с изх. № 19-19-01-45/23.02.2022 г.) и годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 за 2021 г. на СНЦ „МИГ - Айтос“. Докладът е одобрен от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. с доклад № 93-1250/07.03.2022 г. (Писмо от МЗм с изх. №19-19-2-01- 45/14.03.2022 г.).

През 2022 г. от МИГ са извършени разходи към външни експерти оценители, свързани с оценка на проектни предложения, постъпили за финансиране към стратегията за ВОМР.

Извършен е разход за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013, съгласно договор от 01.09.2022 г. с изпълнител „АМАЛА КРАФТ“ ЕООД.

Реализирани са 8 броя публикации във вестник „Народен приятел“- приложение на регионален вестник „Черноморски фар“, както следва:

1. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 80/8388/ 25-28 ноември 2022 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 593/ 25-28 ноември 2022 г. – 1 брой;

2. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 81/8389/ 29 ноември – 01 декември 2022 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 594/ 29 ноември – 01 декември 2022 г. – 1 брой;

3. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 83/8391/ 06 – 08 декември 2022 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 596/ 06– 08 декември 2022 г. – 1 брой;

4. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 86/8394/ 16 – 19 декември 2022 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 599/ 16– 19 декември 2022 г. – 2 броя;

5. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 87/8395/ 20 – 22 декември 2022 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 600/ 20 – 22 декември 2022 г. – 1 брой;

6. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 88/8396/ 23 декември 2022 г. – 05 януари 2023 г., приложение вестник „Народен приятел“ брой 601/23 декември 2022 г. – 05 януари 2023 г. – 2 броя.

Реализирани са 3 броя излъчвания в регионална телевизия „Канал 0 Бургас:

- 3 (три) излъчвания на телевизионен материал, заснет с камера с продължителност 29:29 минути. Видеоматериалът е свързан с популяризиране на дейността на МИГ- предоставяне на информация за проекта на тема "Напредък в изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна Инициативна група – Айтос” към 13.12.2022 г."

Обща продължителност на излъчванията в Телевизия „Канал 0 Бургас“- 87:87 минути.

Представен е Сертификат за излъчения материал в „Канал 0- Бургас“.

Извършен е разход за изработване на информационен филм, вкл. превод и субтитри на английски език с продължителност от минимум 19 минути (сценарий, запис,обработка, монтаж, озвучване), насочен към изпълнението на СВОМР, популяризиране на подхода ВОМР на територията на община Айтос по ПРСР 2014-2020 г., съгласно договор от 13.10.2022 г. с изпълнител „КОСТАДИНОВ БГ“ ЕООД.

Организиран и проведен двудневен празник на местната общност на територията на МИГ „Айтос“ под надслов "Пътят на общността", включващ:

Ден 1: Общностен териториален празник „Креативни пространства“

Във връзка с подготовката и провеждането на Ден 1: Общностен териториален празник „Креативни пространства“ от двудневен празник на местната общност на територията на МИГ „Айтос“ под надслов "Пътят на общността" се изпълниха следните дейности:

1. Организационни дейности (включва наема на сцена, осветление, озвучителна техника, сценарий, водещ);

2. Закупуване на комплект маса с 2 пейки;

3. Закупуване на покривки за маси с български шевици;

4. Концерт на местни и гостуващи изпълнители и състави/формации с продължителност 2 часа;

5. Творчески ателиета „С духа на айтоските майстори“ (хонорари за трима майстори за демонстрации на стари занаяти – грънчарство, медникарство, приложни изкуства и материали)(3 хонорара по 300 лева – 900 лв., 100 лв. материали);

6. Дегустация на местни продукти, храни и напитки (за 100 гости по 18 лв. пакет).

Ден 2: Публично събитие на открито - Общностен териториален празник „Колективни спортове“.

Във връзка с подготовката и провеждането на Ден 2: Публично събитие на открито - Общностен териториален празник „Колективни спортове“ от двудневен празник на местната общност на територията на МИГ „Айтос“ под надслов "Пътят на общността" се изпълниха следните дейности:

1. Организационни дейности (включва наема на сцена, осветление, озвучителна техника, сценарий, водещ);

2. Концерт на местни и гостуващи изпълнители и състави/формации с продължителност 2 часа;

3. Спорт на открито - турнир по футбол (хонорари на 2 треньори х 200 лева);

4. Спорт на открито - турнир по волейбол (хонорари на 2 треньори х 200 лева);

5. Спорт на открито - турнир по борба (хонорари на 2 треньори х 200 лева);

6. Дегустация на местни продукти, храни и напитки (за 100 гости по 18 лв. пакет).

Извършен е разход за изработка и доставка на следните рекламни материали за популяризиране на СВОМР на МИГ „Айтос“, съгласно договор от 22.11.2022 г. с изпълнител „ИНФОВИЗИОН“ ЕООД:

- Футболни топки - 100 броя;
- Волейболни топки - 100 броя;

- Гумени топки - 100 броя;
- Спортни сакове - 100 броя;
- Памучни торбички - 250 броя;
- Екологичен бележник А5 изработен от бамбук със 70 страници, изработен от неизбелена рециклирана хартия и химикал изработен от бамбук - 250 броя.

Извършен е разход за изработка и доставка на следните рекламни материали за популяризиране на СВОМР на МИГ „Айтос“, съгласно договор от 22.11.2022 г. с изпълнител „МАЙСТОРИТЕ – АА“ ЕООД:

- Комплект глинени гърнененца (2 бр.), със специфчна балканска шарка, характеризиращ местната териториална идентичност "Керамиката на Айтос";

През 2022 г. са проведени две еднодневни обучения на бенефициенти и местни лидери на тема: "Мониторинг и контрол на проекти, финансирани от СВОМР" за най-малко 10 участници (зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор).

Обученията са проведени в гр. Айтос на 9 ноември и 7 декември 2022 г.

В хода на обученията са разгледани множество примери и казуси по темата. Обученията допринесоха за повишаване капацитета на бенефициентите/местните лидери по отношение на техническото и финансово изпълнение на проекти по Стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос“ в съответствие със законовите изисквания и указанията на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и ДФЗ.

С писмо с изх. № 376/24.10.2022 г., МИГ е уведомила Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“ за провеждане на обученията.

Дейността е реализирана в изпълнение на договор от 04.10.2022 г. с изпълнител ЧС „Средецките читалища 2012“.

Обучение на местни лидери/представители на социално - уязвими групи за активиране участието им в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР на тема "Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ „Айтос“ на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР от България и ЕС"- еднодневно обучение за най-малко 10 участници (зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор):

През периода на отчета са проведени три еднодневни обучения на местни лидери/представители на социално - уязвими групи за активиране участието им в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР на тема "Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ „Айтос“ на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР от България и ЕС". Обученията се проведоха при следния график:

- 15.11.2022 год. в гр. Айтос;
- 16.11.2022 год. в с.Тополица;
- 17.11.2022 год. в с.Карагеоргиево.

Присъстващите са обменили идеи и добри практики за повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ „Айтос“ на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР от България и ЕС.

С писмо с изх. № 376/24.10.2022 г., МИГ е уведомила Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“ за провеждане на обученията.

Дейността е реализирана в изпълнение на договор от 04.10.2022 г. с изпълнител ЧС „Средецките читалища 2012“.

През 2022 г. са проведени три работни/информационни срещи за повишаване активността на местните общности за участие в процеса на прилагане на СВОМР (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства) за най-малко 10 участници (зала, кафе-паузи). Срещите се проведоха при следния график:

- 08.12.2022 год. в гр. Айтос;
- 23.11.2022 год. в с.Пещерско;
- 24.11.2022 год. в с.Пирне.

С писмо с изх. № 376/24.10.2022 г., МИГ е уведомила Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“ за провеждане на обученията.

Дейността е реализирана в изпълнение на договор от 04.10.2022 г. с изпълнител ЧС „Средецките читалища 2012“.

Екипът на МИГ „Айтос” е осъществил дейности, свързани с индивидуално информиране и консултиране на потенциални кандидати за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени са 23 броя индивидуални консултации, свързани с предстоящи приеми на проекти. Потенциалните бенефициенти са консултирани по телефона.

Индикатор	Мъже		Жени		Общо
	< 25	≥25	< 25	≥25	
Брой консултирани потенциални бенефициенти	0	12	0	11	**23**
Брой на участниците в обучения	0	14	0	42	**56**
Брой на участниците в семинари и информационни срещи	1	12	0	20	**33**

Като основен проблем и риск пред прилагането на стратегията и през 2022 г. се определя нарастването на цените на стоките и услугите. Това има значително неблагоприятно въздействие, създаващо висок риск за изпълнение на одобрените за финансиране проекти. Тъй като МИГ не може да влияе на тези процеси, е необходима промяна на приложимото законодателство, свързана с изпълнението на сключените административни договори за получаване на БФП, съобразена с новите реалности.

Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 за 2022 г.

Със Заповед на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ № 03-РД/4061 от 20.12.2021г. е одобрена като законосъобразно процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН: BG06RDNP001-19.226-S3. СНЦ „МИГ-Айтос“ е информирано с Писмо от ДФ „Земеделие“ с изх. № 01-6300/332 от 23.02.2022 год. ИСУН: BG06RDNP001-19.226-S3.

Прием на проектни предложения

МИГ „Айтос“ е обявила и провела прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.536 (първи прием) по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока.

В хода на обявения прием са подадени общо 4 (четири) проектни предложения с кандидат Община Айтос:

- BG06RDNP001 -19.536-0001 с наименование „Реконструкция на ул. .Димитър Благоев“, гр. Айтос“;

- BG06RDNP001 -19.536-0002 с наименование „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“;

- BG06RDNP001-19.536-000J с наименование "Обзавеждане и оборудване за социални услуги, предоставяни на територията на Община Айтос“;

- BG06RDNP001-19.536-0004 с наименование „Изграждане на детска площадка в УПИ HI, кв- ЗА и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“.

Проектите са оценени от МИГ и предстои оценката им от ДФЗ.

МИГ е сключила 2 (два) нови договора за изпълнение на проекти:

- по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.270 (първи прием) о Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0001-C01 от 28.03.2022 г., проект „Инвестиция в машини и оборудване във фирма "Юха - 81" ЕООД град Айтос“, бенефициент „ЮХА - 81“ ЕООД;

- По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 (трети прием): Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0006-C01 от 25.03.2022 г, проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване", бенефициент Община „Айтос“.

МИГ „Айтос“ е изготвила 8 становища за сключване на анекси, както следва:

- Административен договор BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021г. след проведена обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет доставка и монтаж на оборудване;

- Административен договор BG06RDNP001-19.270-0012-C01 от 12.03.2021г. във връзка с промяна на банковата сметка на бенефициента „Костови груп“ ООД;

- Писмо с изх. №363/02.06.2022 г. относно одобрение на заявление за промяна на Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0001-C01/28.03.2022 г.;

- Писмо с изх. № 365/29.06.2022 г. относно съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.01.2021 г.;

- Писмо с изх. № 366/29.06.2022 г. относно съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0002-C01 19.03.2021 г.;

- Писмо с изх. № 318/05.10.2021 г. относно: Становище за сключване на анекс към Административен договор № BG06RDNP001-19.333-0002-C01/21 31.08.2021 г.;

- Писмо с изх. № 379/01.11.2022 г. относно: Одобрение/становище на заявление за сключване на анекс към Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0006-C01 от 25.03.2022 г.;

- Писмо с изх. № 385/22.12.2022 г. относно: Одобрение на Молба от 16.12.2022 г. за анекс към Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004- C01/17.12.2020 г.

Подписани са два Анекса към следните Административни договора за изпълнение на проекти по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", процедура чрез подбор на проектни предложение № BG06RDNP001-19.226:

1. Анекс № BG06RDNP001-19.226-0003-C04 от 05.12.2022 г. към Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.01.2021 г. за проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос", бенефициент ОБЩИНА АЙТОС;
2. Анекс № BG06RDNP001-19.226-0006-C02 от 05.12.2022 г. към Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0006-C01 от 25.03.2022 г. за проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване", бенефициент ОБЩИНА АЙТОС.

Изводи и препоръки


Местната инициативна група е структура, която се утвърдила на територията на община Айтос. В органите на МИГ са включени местни лидери и експерти с богат опит и доказан професионализъм при работата по подхода ВОМР. През разглеждания период МИГ е открила редица приеми по мерки от стратегията, разгледани и оценени са всички постъпили проектни предложения, консултирани са всички желаещи да получат информация кандидат бенефициенти, проведени са обучения и е публикувана информация относно възможностите за кандидатстване с проекти по стратегията за ВОМР.

От основно значение е изпратените за проверка в ДФЗ оценителни процедури и проектни да бъдат своевременно обработени, за да не се допусне значително забавяне, което ще има негативни последици за крайните бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ "Айтос". Забавянето при разглеждане на оценителни процедури и проектни предложения от своя страна има редица негативни последствия – забавяне на сключване на административни договори, отказване на потенциални бенефициенти за сключване на договори или подаване на предложения, които не са били одобрени поради несъответствие на критериите или недостиг на финансов ресурс, забавяне в откриване на приеми със свободен финансов ресурс. Всичко изброено също така демотивира потенциални бенефициенти, особено тези, чийто интерес е насочен към частните мерки.

През целия период, независимо от епидемиологичната обстановка, местната инициативна група успешно организира изпълнението на всички дейности по изпълнението на мярка 19.2 и мярка 19.4. С висок професионализъм, екипът също провежда и процедурите по приемане на проектни предложения и тяхното оценяване. С тези си действия, МИГ успява да спази сроковете за дейностите и да не допусне забавяне от своя страна, въпреки условията на пандемия. Да не забравяме и факта, че наличието на подадени проектни предложения зависи от трети страни, на

които е нужно отделено време, консултации и обучения. Това от своя страна е висока оценка за професионализма на екипа на местната инициативна група.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Айтос“ е еднофондова с бюджет от 3 732 745 лв. и по нея към момента на изготвяне на настоящия анализ има общо 17 сключени договори, на обща стойност 2 892 973,95 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 2 290 111,33 лв. По стратегията са подпомогнати 12 бенефициенти, като общата стойност на възстановените разходи е в размер на 528 146,95 лв. Степента на договарянето на средствата е 61%, което е показател за извършената от МИГ работа.

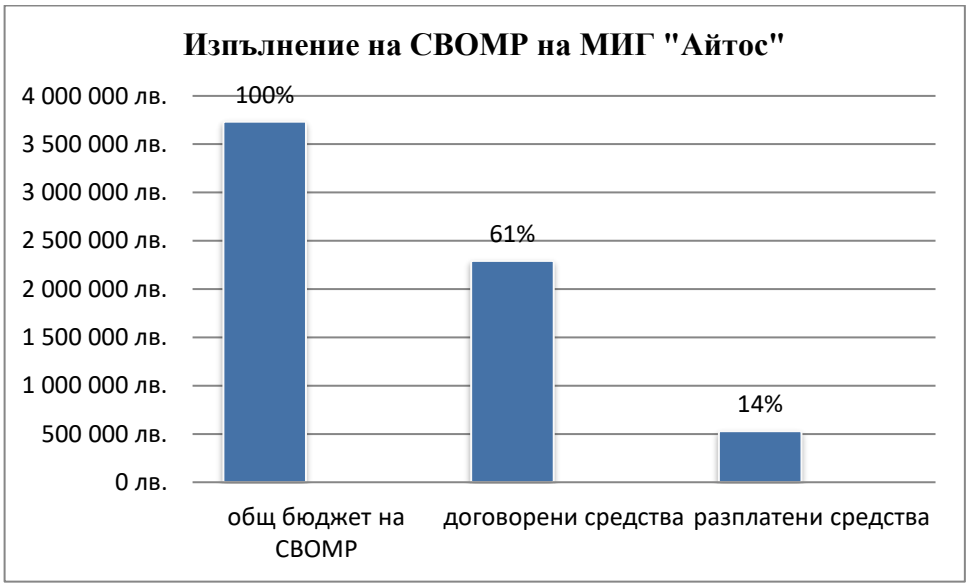

По-подробна информация относно одобрените проекти към стратегията на МИГ „Айтос“ е представена в следващата таблица.

Таблица. Проекти към стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос“

Бенефициент	Местонахождение	Наименование на проекта	Обща стойност	БФП	Собствено съфинансиране от бенефициента	Реално изплатени суми
"Дюлгер груп" ЕООД	гр.Айтос	Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели	180,500.00	135,375.00	45,125.00	0.00
"Костови груп" ООД	гр.Айтос	Закупуване на машини за производство на бисквити	186,650.00	139,987.50	46,662.50	0.00

„Ангелика – 81“ ООД	гр.Айтос	„Изграждане на производствена сграда и закупуване на машини за производство на PVC и алуминиева дограма”	157,564.05	118,173.04	39,391.01	0.00
„ДЖИ ЕС КАР“ ООД	гр.Айтос	Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка	82,099.10	61,574.33	20,524.77	0.00
„ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ ЕООД	гр.Айтос	Оптимизиране на производствения процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНА	41,274.30	30,955.73	10,318.57	0.00
„Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - д-р Василена Чаушева“ ЕООД	гр.Айтос	Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос.	122,242.02	91,681.52	30,560.50	0.00
„Модул“ ЕООД	гр.Айтос	Модернизиране на производството на Модул ЕООД, гр. Айтос	124,301.82	93,226.36	31,075.46	0.00
Община Айтос	Айтос	„Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново	279,535.86	279,535.86	0.00	269,985.70

		и с. Малка поляна/”				
Община Айтос	гр.Айтос	"Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”	390,517.84	390,517.84	0.00	187,050.00
Община Айтос	гр.Айтос	„Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”	176,554.60	176,554.60	0.00	71,111.25
Община Айтос	гр.Айтос	„Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“	261,845.61	261,845.61	0.00	0.00
Община Айтос	гр.Айтос	"Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване"	70,476.31	70,476.31	0.00	0.00
СЕ БЕ ГИН - амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и	гр.Айтос	"Закупуване на специализирана медицинска техника за кабинет на доктор-гинеколог"	103,900.00	51,950.00	51,950.00	0.00

гинекология индивидуална практика „АСИМПАГИ П“ ЕООД						
„Хелиос милк“ ЕООД	гр.Айтос	Модернизация на млекопреработвателно предприятие	194,650.00	97,325.00	97,325.00	0.00
„Хелиос милк“ ЕООД	с.Пирне	Закупуване на земеделска техника и оборудване за краве ферма	199,900.00	99,950.00	99,950.00	0.00
Шефика	с.Черноград	„Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“	198,956.81	99,478.41	99,478.40	0.00
„Юха – 81“ ЕООД	гр.Айтос	Инвестиция в машини и оборудване във фирма "Юха - 81" ЕООД град Айтос	122,005.63	91,504.22	30,501.41	0.00

Трябва да се отбележи, че местната инициативна група, работейки в много сложна и променяща се обстановка, се справя на много високо професионално ниво със задачата си за прилагане на стратегията и е извършила всички необходими дейности, които са в нейната компетенция. За получаването на пълна картина на изпълнението на стратегията за ВОМР е необходимо текущото ежегодно извършване на оценка на нейното прилагане. По този начин МИГ ще разполага със своевременна информация и ще има възможност за взимане на управленски решения, когато това е необходимо.

Доклад за мониторинг за изпълнението на СВОМР се извършва за втори опит. Първият наблюдаван период е от началото на изпълнение на стратегията за ВОМР до 31.12.2020 г., а вторият от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. Ако се направи съпоставка между двата периода, то може да се заяви, че през първия период МИГ е извършил основната подготовка за изпълнението на СВОМР, което е по-осезателно през втория мониторингов период. И през двата периода са открити приеми на проекти по мерките на СВОМР- През първия период са открити 8 приема, а през втория приемите са по-малко, но пък започва сключването на договори по проектите, от приемите, открити през първия мониторингов период. Така през втория период са сключени 10 договора, което дава положителен тласък при прилагането на СВОМР. В това отношение за разлика от данните през първия период, през втория се забелязва и напредък в постигането на различни индикатори от заложените в СВОМР. За целия изминал период на прилагане на

СВОМР от 2016 до 2022 г. МИГ е извършила всичко необходимото за успешното изпълнение на стратегията, което е от ключово значение за развитието на местната общност.

Изводите, които могат да бъдат направени на база данните през втория мониторингов период са, че МИГ "Айтос" успешно е извършила дейностите от изпълнението на стратегията за ВОМР. Осигурени са договори с изпълнители на дейности, които са основни за изпълнението на стратегията, проведени са обучения, консултации, работни срещи, както и публикации и информационни срещи за информиране на местната общност относно активността по изпълнение на стратегията за ВОМР.

Основен проблем и през 2021 година остава ситуацията с Ковид 19. Работата в такава обстановка е довела до непредвидени промени и реформи в стила на работа на МИГ, като това се е отразило и на изпълнението на заложените в бюджета за 2021 г. дейности. Много от тях не са извършени, като това не е повлияло негативно на цялостното прилагане на стратегията. Извършени са дейности за 68% от предвидените в бюджета разходи.

През периода МИГ е извършила дейностите по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, спазвайки нормативно установените изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на местната общност, както и необходимите действия за обучение и информиране на местната общност. МИГ успешно е организирала оценката на проектите, които са получени по откритите приеми.

МИГ функционира със заемни средства по договор за овърдрафт, които са дължими и следва да бъдат възстановени на банката, ведно с фиксираната им лихва, което показва самостоятелност, но и създава финансови затруднения. През четвъртото тримесечие на 2021 год. разходите за ел. енергия на МИГ „Айтос" са се увеличили с над 200%. Високо увеличение на всички разходи се наблюдава и през 2022 г. и на национално ниво са необходими бързи мерки, компенсиращи високият ръст на почти всички цените.

МИГ „Айтос" е изпълнила успешно необходимите дейности по мярка 19.4. МИГ е осигурила договори с изпълнители на основни за изпълнението на стратегията дейности, провела е консултации, обучения и работни срещи, както е и информирала местната общност относно дейностите по изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ е постигнала тези резултати като е използвала почти 2/3 от заявения бюджет, което говори за извършеното добро планиране на необходимите средства за 2021 г. През 2021 г. МИГ е извършила дейностите по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, спазвайки нормативно установените изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на местната общност. През 2021 г. МИГ е извършила необходимите действия за обучение и информиране на местната общност, като най-важното – организирала е оценката на получените по откритите приеми проекти.

Може да се направи заключение, че към момента на изготвяне на настоящата оценка МИГ успешно изпълнява дейностите по подмярка 19.4 като огромен принос за това е опитът и професионализма на екипа на МИГ, членовете на УС и подкрепата, която групата получава от местната общност. Въпреки затруднените условия през повечето месеци на 2021 г., поради епидемиологичната обстановка и строгите изисквания за изпълнение на част от активностите, МИГ успешно изпълнява планираните дейностите по подмярка 19.4. Прецизното планиране и професионалното изпълнение на дейностите допринася за крайния успех през конкретния период.

7. Заключение

На базата на събраните данни и представена информация в настоящия доклад може да се заключи, че МИГ „Айтос“ успешно се е справила с изпълнението на СВОМР за мониторинговия период. През него тя е извършила планираните приеми на проектни предложения и е скрючила договори по одобрените проекти в изпълнение на подмярка 19.2. МИГ е извършила и редица дейности за управление и популяризиране на СВОМР, в които активно участие е взела местната общност.

Според събраната информация, можем да направим заключение, че местната инициативна група е завършила значителен брой дейности и успешно е разрешила възникналите въпроси и предизвикателства в хода на работа по изпълнение на стратегията на ВОМР за 2021 и 2022 г.

От основно значение е изпратените за проверка в ДФЗ оценителни процедури и проектни да бъдат своевременно обработени, за да не се допусне значително забавяне, което ще има негативни последици за крайните бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ “Айтос“. Забавянето при разглеждане на оценителни процедури и проектни предложения от своя страна има редица негативни последствия, както беше отбелязано по-рано – забавяне на сключване на административни договори, отказване на потенциални бенефициенти за сключване на договори или подаване на предложения, които не са били одобрени поради несъответствие на критериите или недостиг на финансов ресурс, забавяне в откриване на приеми със свободен финансов ресурс. Всичко изброено също така демотивира потенциални бенефициенти, особено тези, чийто интерес е насочен към частните мерки.

През целия разглеждан период, независимо от епидемиологичната обстановка през месеците на 2021 г., местната инициативна група успешно организира изпълнението на всички дейности по изпълнението на мярка 19.2. С висок професионализъм, екипът също провежда и процедурите по приемане на проектни предложения и тяхното оценяване. С тези си действия, МИГ успява да спази сроковете за дейностите и да не допусне забавяне от своя страна, въпреки условията на пандемия. Да не забравяме и факта, че наличието на подадени проектни предложения зависи от трети страни, на които е нужно отделено време, консултации и обучения. Това от своя страна е висока оценка за професионализма на екипа на местната инициативна група.

МИГ „Айтос“ извършва дейности по популяризиране на СВОМР с висок професионализъм, прецизност, умение за планиране, гъвкавост и активност. Изпълнението на подмярка 19.4, осигуряваща средствата за управление показва високия капацитет, постигнат от местната инициативна група. Всички нормативни изисквания са спазени. Налична е интензивна кореспонденция с УО на програмата за развитие на селските райони, Държавен фонд „Земеделие“ и потенциалните бенефициенти.

Основната препоръка към МИГ за успешното прилагане на стратегията за ВОМР е да продължи да работи както през периода, предмет на настоящата оценка. Според събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на високо ниво с изпълнението на своята стратегия и е преодоляла възникналите по време на оценявания период трудности и предизвикателства.

Основната препоръка към МИГ е да продължи да изпълнява с висок професионализъм и качество задълженията си при прилагането на стратегията за ВОМР на високо професионално ниво, както и досега.
